


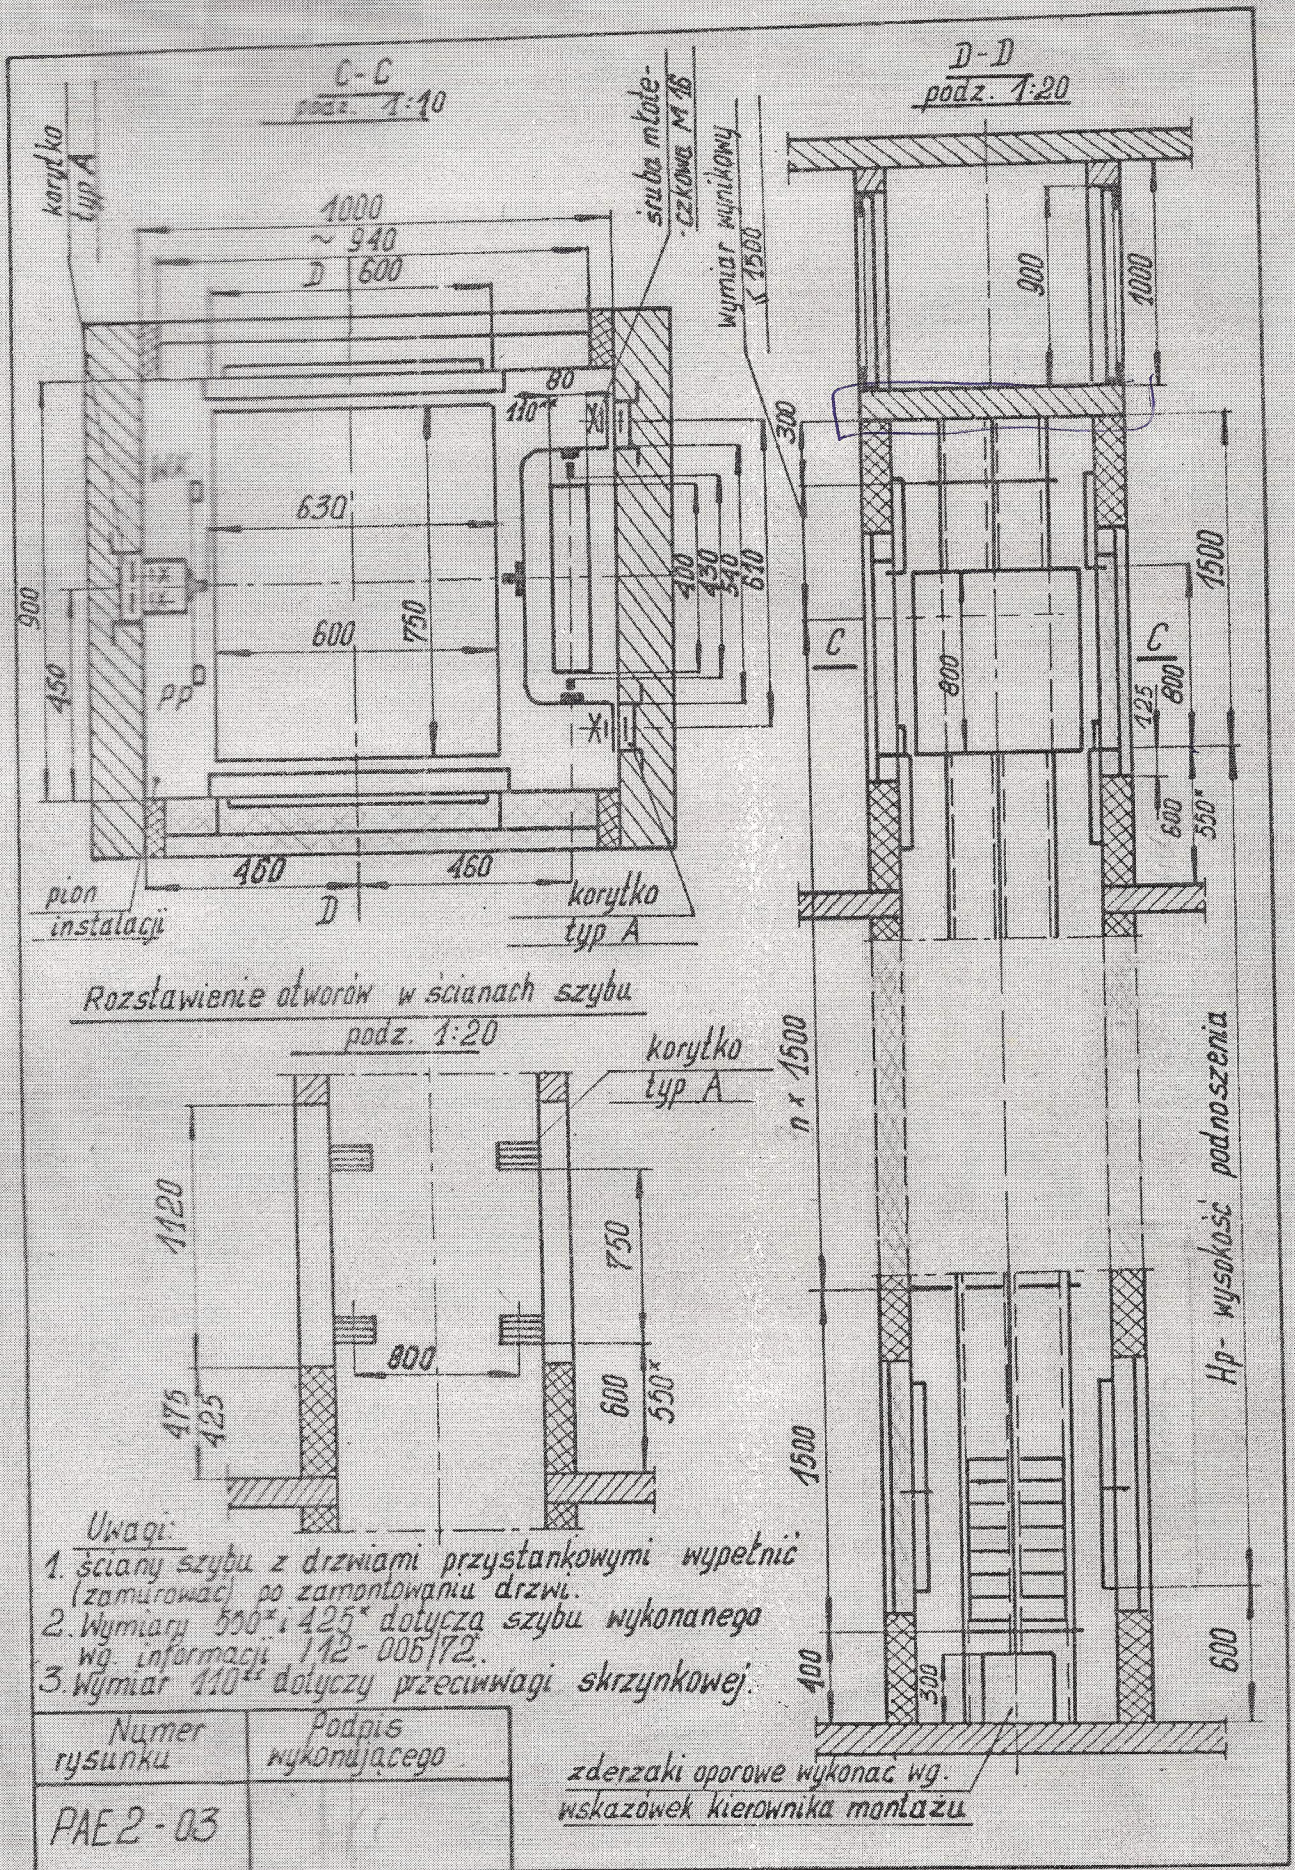


Winda *istniejąca*

A-A

podcz: 1:10


B

B

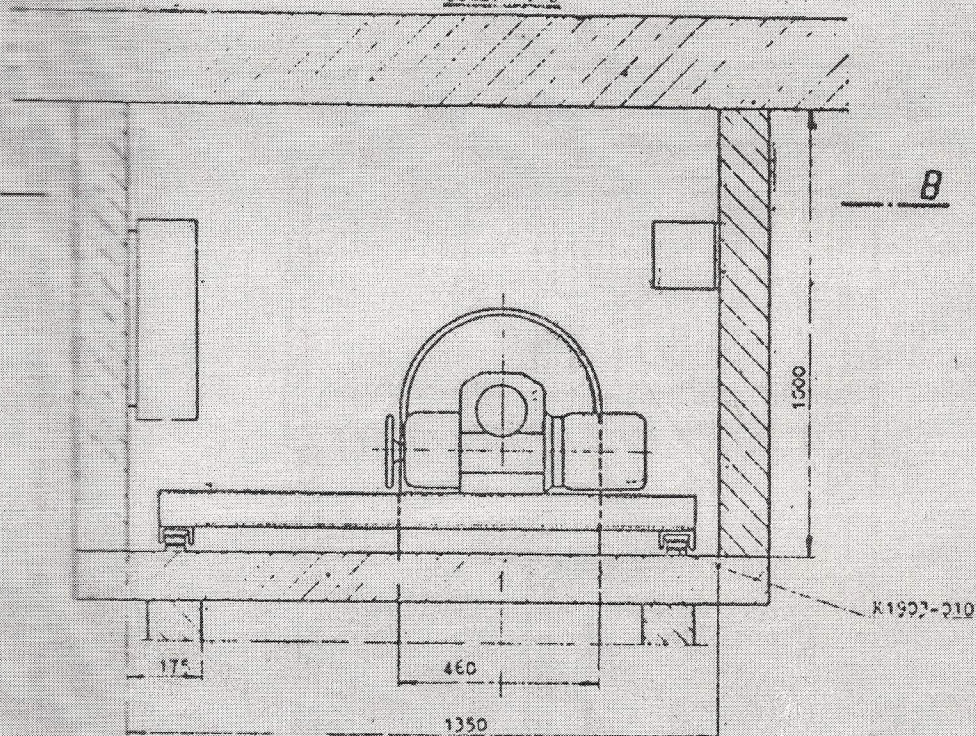

B-B

podcz: 1:10

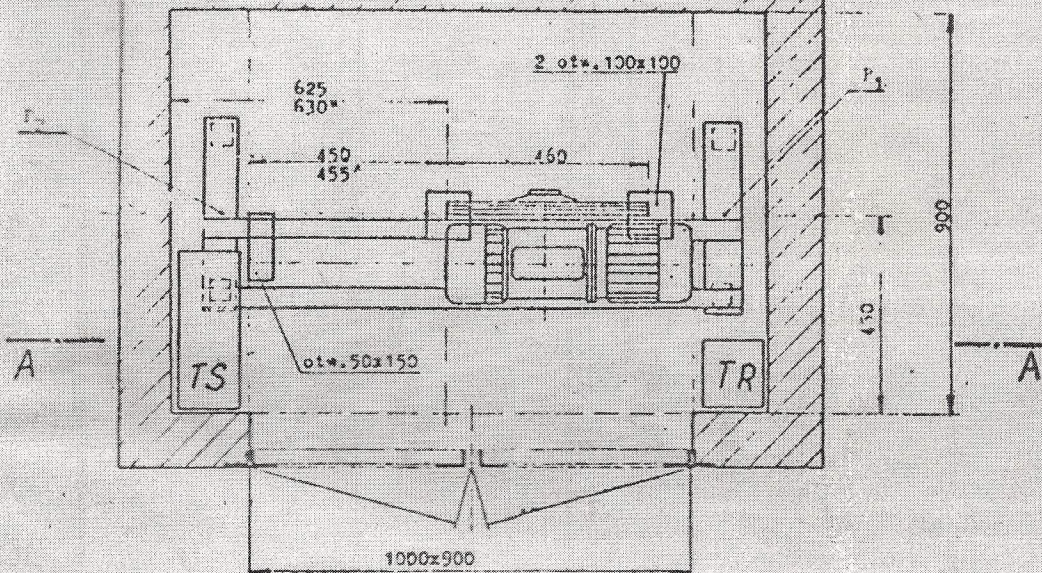

UWAGI:

1. obciążenie dynamiczne w punktach $P_1=0,7 T$; $P_2=0,3T$
2. TR- tablica rozdzielcza osterceza Generalny Wykonaw n/
3. TS- tablica sterow /do tarczy K.D.O./
4. szynki 455 i 600 dot czął wogu PAZ

IMPLER RYGUNDU	PODPIS WYKONAJĄCEGO
PAZ/M - 01	

Winda Istotajaca

Spis dokumentacji

1. Opis techniczny.

2. Warunki wykonania szybów i pomieszczeń maszynowni dla dźwigów towarowych.
3. Wytyczne dla zamawiającego.
4. Schemat instalacji zasilającej dźwigi towarowe 112-006 E(T).
5. Rysunki szybów o numerach:
6. Rysunek maszynowni o numerach:
Schemat elektryczny (sterowania) dźwigu dostarcza Zakład Montażu Dźwigów.

OPIS TECHNICZNY

Charakterystyka dźwigu towarowego

Udźwig 100 (kG)

Wysokość podnoszenia 6 (m)

Prędkość jazdy 0,5 (m/s)

Ilość przystanków 2 (m/s)

Ilość drzwi przystankowych 2 (m/s)

Drzwi przystankowe konstrukcji stalowych o wymiarach w świetle:

szerokość 600 (mm)

wysokość 800 (mm)

Rygle do drzwi przystankowych typ:

Kabina metalowa o wymiarach:

szerokość 600 (mm)

głębokość 350 (mm)

wysokość 800 (mm)

przelotowe nieprzelotowe

Reduktor typ: 1120 (mm)

Sterowanie elektryczne przyciskowe, zewnętrzne

Napięcie robocze 220 (V)

Silnik elektryczny 0,55 : N = 0,55 (kW, n = 915 (obr/min) w obudowie okapturzonej

Aparatura sterowa typ: 50210-002 (mm)

Schemat typ: 50210-002 (mm)

Instalacja elektryczna: zerowa, uziemniona

Rodzaj instalacji: uszczelniona, zwykła

Liny $\phi 8$ (mm) w 2 odcinkach 22m (mm)

Winda Istniejąca

PROTOKOŁ odbioru części budowlanej dźwigu

dnia 89.01.16.....niżej podpisany inspektor nadzoru
inwestorskiego.....St. inspektor.....Zygmunt Rzeżuski.....

/ wymienić tytuł, imię i nazwisko/

zakończył odbiór techniczny części budowlanej dźwigu / wym. rodzaj /

DT 2.....Q 100 kg.....

położonej na nieruchomości / podać dokładny adres/ ...09-407 Jłock.....

ul. ...Łęczyński nr. 14.....

przy udziale przedstawiciela / podać imię, nazwisko, tytuł, funkcję/

po przeprowadzeniu oględzin na miejscu oraz zbadaniu projektu zatwierdzonego

z dnia 10.06.....19.86 r. Nr.....

przez ...Jugopol...Pocłuski...Zagranice.....

/ podać organ który zatwierdził projekt/

Stwierdzono co następuje:

1. Maszynownia i szyp zostały wykonane zgodnie z zatwierdzeniem projektem i przepisami zarządzenia Nr 130 MBiPMB z dn. 29.06.66r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego/Dz.Bud.Nr10poz.44z późniejszymi zmianami/ oraz wymaganiami PN-75/M 45360; PN-73/M 45363; PN-71/M 45361 lub PN-71/M45362 w zależności od typu dźwigu.
2. Maszynownia i szyp zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem izolacji akustycznej.
3. Maszynownia i szyp mają ściany i stropy o odporności ogniowej klasy.....IV.....
4. Maszynownia ma podłogę o wytrzymałości na obciążenie.....470 250.....kg/m²
5. Ściana szybu na której osadzone będą drzwi przystankowe ma powierzchnię gładką z odchyleniem od pionu max.....10.....mm.
6. Pozostałe ściany szybu są gładkie z odchyleniem od pionu25.....mm.
7. Szyp ma nadszypie o wysokości1400.....mm.
8. Szyp ma podszypie o głębokości600.....mm.
9. Inne stwierdzenia i uwagi.....

.....
/ kierownik budowy/

.....
/ Inspektor nadzoru/

Winda istniejąca
