



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dnia 19.07.2018r.

WOP-I.ZO.0003.2468.2018.AK
WIR.0003.29.2018.EB

**Szanowna Pani
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka**

dotyczy: interpelacji Pani radnej Wioletty Kulpy złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 05.07.2018 roku przekazanej pismem WOP-I-ZO.0003.2468.2018.AK, dotyczącej realizowanej inwestycji ulicy Rozego

Odpowiadając na Pani interpelację nr WOP-I-ZO.0003.2468.2018.AK złożoną między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 05.07.2018 roku, dotyczącą realizowanej inwestycji ulicy Rozego informuję, iż termin zakończenia przebudowy ulic Rozego i Kołłątaja to 20 lipca 2018 roku. Zmiana terminu umowy z Wykonawcą podyktowana jest wystąpieniem w trakcie robót niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z technologią, co zostało udokumentowane przez Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru zgodnie z par. 3 ust. 2 i 3 umowy. Wykonawca przedstawił również dane meteorologiczne dla miasta Płocka wydane przez Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Budowlanego w Warszawie, które potwierdzają powyższy fakt. Ponadto przebudowa ulicy przebiegała przy udziale gestorów sieci znajdujących się w ulicy, tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej (Wodociągi Płockie Sp. z o.o.) i sieci ciepłowniczej (Fortum Płock Sp. z o. o.). Roboty prowadzone przez firmę Fortum związane z siecią ciepłowniczą zostały rozpoczęte dopiero po zakończeniu sezonu grzewczego od 08.05.2018 r. co znacznie opóźniło prowadzenie prac w branży drogowej.

W trakcie realizacji robót drogowych mieszkańcy ulicy Rozego zgłaszali swoje potrzeby związane z wykonaniem zjazdów (ich poszerzenia, dojazdami do pojemników śmietnikowych) oraz rzędnymi wysokościowymi. Powyższe uwagi zostały rozpatrzone przez Inspektorów Nadzoru oraz Projektantów. Zmiany rzędnych wysokościowych były rozpatrzone z dostosowaniem do istniejących zjazdów oraz infrastruktury z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów technicznych. Nie wszystkie uwagi i sugestie mieszkańców były brane pod uwagę ze względu na ich brak wiedzy w zakresie drogownictwa.

Poniżej pokazuję w jaki sposób zostały wykonane fragmenty ulicy Rozego, do których Pani

zgłasza uwagi w swojej interpelacji kiedy jeszcze trwały prace drogowe.


1. Zejście z Alei Piłsudskiego do ulicy Rozego zostało wykonane zgodnie z przepisami i sztuką wykonania prac budowlanych. Należy nadmienić, że ulica Rozego jest tzw. „ślepą ulicą”, tzn. że ma jeden wjazd, wyjazd i dojeżdżenie od ul. Otolińskiej. Przejście w ogrodzeniu z Al. Piłsudskiego do ul. Rozego wykonane zostało przez mieszkańców ul. Rozego w celu skrócenia sobie dojeżdżenia do miejsc znajdujących się przy Al. Piłsudskiego.



Fot. 1. Zejście z ul. Piłsudskiego na ulicę Rozego zgodne z uzgodnieniami z projektantem i przepisami technicznymi.




Fot. 2. Chodnik i wjazd do posesji z zachowaniem spadków zgodnych z przepisami technicznymi.

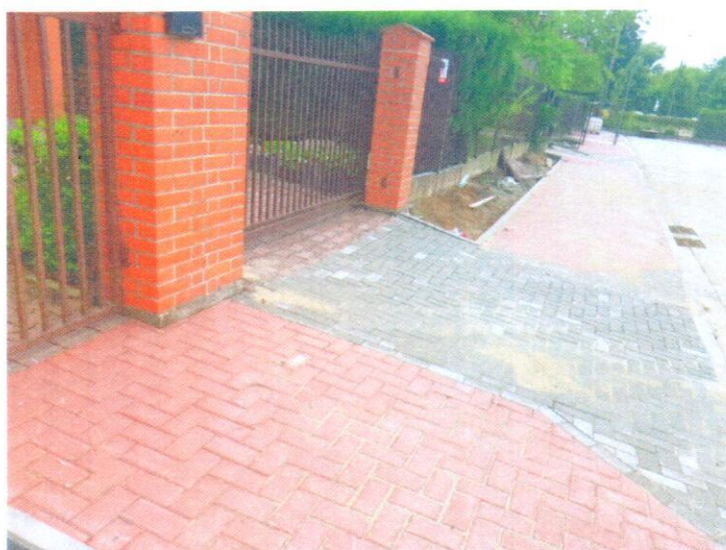

Fot. 3. Wykonane łączenie chodnika i zjazdu z posesją.



Fot. 4. Wykonane chodniki i wjazdy do nieruchomości i ich połączenia z posesją. Zachowane spadki zgodne z przepisami technicznymi.

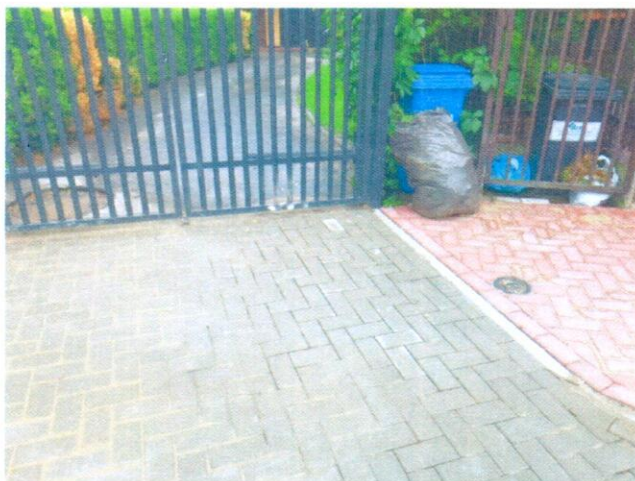

Fot. 5. Wykonanie wjazdu i chodnika oraz ich połączenie z posesją.

Należy nadmienić, że wykonywanie zdjęć na etapie realizacji nie świadczy o źle wykonanych pracach i niewłaściwych rzędnych nawierzchni chodników jak Pani sugeruje. Na potwierdzenie tego faktu załączam powyższe fotografie.

2. Odnośnie uwagi dotyczącej braku wymiany starej pokrywy studzienki teletechnicznej informuję, iż gestorem tej sieci jest firma Orange Polska S. A., która została poinformowana o planach przebudowy ulic Kopernika, Heweliusza, Krzywickiego, Staszica, Rozego i Kołłątaja, jednak nie ujęła powyższego zakresu robót w swoich planach ani inwestycyjnych, ani remontowych i nie widziała takiej potrzeby na obecnym etapie. Należy zaznaczyć, że przedstawiciele firmy uczestniczyli w przekazaniu placu budowy oraz na bieżąco byli informowani przez Inspektorów o potrzebach, jednak nie podjęli żadnych kroków w tej sprawie.

3. W związku z zarzutem dotyczącym rozkopów na prywatnych działkach informuję, że Gmina Miasto Płock wykonywała prace tylko w granicach pasa drogowego. Natomiast równolegle do naszych robót była wykonywana wymiana przyłączy wodociągowych przez Wodociągi Płockie oraz wymiana przyłączy ciepłowniczych przez Fortum, których wykonanie było niemożliwe bez wejścia na działki mieszkańców. Odtworzenie nawierzchni po tych robotach należy do w/w gestorów sieci. Ponadto informuję, że w czasie realizacji ulicy Rozego wykonawca wykonuje tylko prace w pasie drogowym stanowiącym własność Gminy Płock. Nie wykonywane są prace na działkach poszczególnych właścicieli, np. utwardzenia terenu pod pojemniki na śmieci itp.

4. Odnośnie różnorodności nawierzchni na przebudowywanych ulicach na tym osiedlu informuję, że nawierzchnie są wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną. Tylko na ulicy

Kopernika jest ułożony asfalt, a pozostałe przebudowane ulice: Heweliusza, Staszica, Krzywickiego, Kołłątaja i Rozego - mają nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Nadmieniam, że rodzaje nawierzchni wynikają z przepisów technicznych i nie mogą być uzależniane od sugestii mieszkańców.

Nawierzchnia drogi i chodników została wykonana z odpowiednimi spadkami. Pani komentarze na etapie nie "ukończenia" branży drogowej na przedmiotowej budowie były niesłuszne i nie trafione, co widać na załączonych zdjęciach.



Fot. 6. Widok ulicy Rozego po ułożeniu nawierzchni drogi i chodników.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Jacek Terebus
Jacek Terebus
